

# 今期末の未成工事支出金を確認する


## ナビメニュー：原価集計－工事別原価管理表



以下の条件設定を行い、設定終了OKをクリックします。

[条件設定1] 期間: 今期の決算期間を入力します。

金額/残高表示: 期間内の原価(≠0)のみ表示

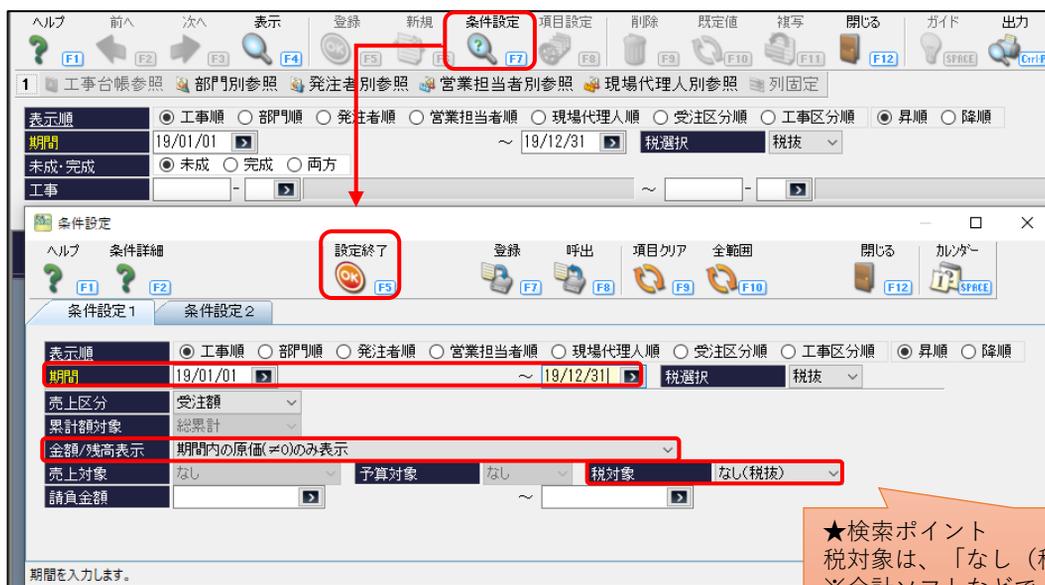

★検索ポイント  
税対象は、「なし(税抜)」を推奨します。  
※会計ソフトなどで、原価は本体(税抜)価格で確認される場合が多いため

[条件設定2] 未成・完成: 未成



# 今期末の未成工事支出金を確認する

条件設定後、画面の「累計原価合計」を確認します。

前述した条件設定を行うと、期間内に原価が発生した未成工事が絞り込まれて、表示されます。これらの工事の合計行の累計原価金額(原価合計の下段)が、期末時点の未成工事支出金となります。

No.	工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	工事区分	売上基準 JV区分	受注日 完成日	契約工期 実施工期	今回請負金額 累計請負金額	入金額 未収金額	予算金額 一般管理費	予算残 予算消化率(%)
1	S2003003-00 105 (株) 横浜土木	3 設備部	杉山 雅博	0 完成基準		19/12/01		0 0	0 0	0 0	-880,000 0.00
2	《 総 合 計 》							0 0	0 0	0 0	-880,000 0.00

出来高金額	出来高残	出来高率	目標利益	目標純利益	実質利益	原価合計	材料費	労務費	↑ 今回原価	↓ 累計原価	仮設機械	外注費	直接経費	給与等	諸経費	経費
0	-800,000		0	0	-880,000	880,000	550,000	220,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0
0.00			0.00	0.00	0.00	880,000	550,000	220,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0
0	-800,000		0	0	-880,000	880,000	550,000	220,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0
0.00			0.00	0.00	0.00	880,000	550,000	220,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0

## <参考> 今期の未成工事支出金合計(完成振替分を含む)を確認する方法

今期の未成工事支出金合計を確認する場合は、「未成・完成:両方」を選択し、表示をクリックします。完成振替を行う場合は、完成工事であっても、未成科目(未成工事支出金)を完成(原価)科目に振り替えるため、未成・完成の区分は「両方」になります。表示される工事の今回原価合計(原価合計の上段)が、今期の未成工事支出金合計になります。

No.	工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	工事区分	売上基準 JV区分	受注日 完成日	契約工期 実施工期	今回請負金額 累計請負金額	入金額 未収金額	予算金額 一般管理費	予算残 予算消化率(%)	
1	20010003-00 1021 中央駅南新築工事 木村不動産(株)	2 建築部	鈴木 慎一郎	1 進行基準		19/10/25 19/12/31	19/11/01 14/10/01	20/01/31 15/02/28	51,000,000 51,000,000	0 56,100,000	42,149,970 6,120,000	2,149,970 94.90
2	20010004-00 107 栗田邸新築工事 栗田 吾郎	2 建築部	林 健二	0 完成基準		19/07/22 19/12/15	19/08/01 14/10/05	19/12/15 15/03/31	25,000,000 25,000,000	0 27,000,000	21,305,050 3,000,000	1,305,050 93.87
3	D2001001-00 105 県道15号線道路 (株) 横浜土木	3 土木部	鈴木 慎一郎	0 完成基準		14/10/06 15/04/30	14/10/06 14/10/06	15/01/31 15/05/20	0 44,000,000	0 31,320,000	27,649,970 5,280,000	-16,916,814 161.18
4	S2003003-00 105 横浜市中区天池町 (株) 横浜土木	3 設備部	杉山 雅博	0 完成基準		19/12/01			0 0	0 0	0 0	-800,000 0.00
5	《 総 合 計 》							76,000,000 120,000,000	0 16,200,000	0 91,104,990	-14,261,794 115.65	

出来高金額	出来高残	出来高率	目標利益	目標純利益	実質利益	原価合計	材料費	労務費	↑ 今回原価	↓ 累計原価	仮設機械	外注費	直接経費	給与等	諸経費	経費
0	-40,000,000		8,850,030	2,730,030	11,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00			17.35	5.35	21.57	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-20,000,000		3,694,950	694,950	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00			14.78	2.78	20.00	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-44,566,784		16,350,030	11,070,030	-566,784	28,000	0	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0
0.00			37.16	25.16	-1.29	44,566,784	36,957,847	1,596,547	950,507	5,054,976	4,144	2,763	0	0	0	
0	-800,000		0	0	-800,000	800,000	500,000	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
0.00			0.00	0.00	0.00	800,000	500,000	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
0	-105,366,784		28,895,010	14,495,010	14,633,216	60,828,000	60,500,000	228,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
0.00			24.08	12.08	12.19	105,366,784	97,457,847	1,796,547	950,507	5,154,976	4,144	2,763	0	0	0	
